



Lean Construction Management

Was ist Lean Construction Management?

Ein agiles Projektentwicklungssystem, welches die Kommunikation zwischen den Planungsteams fördert, Prozesse transparent abbildet und Verzögerungen im Informationsfluss verringert.

Kontinuierliche Verbesserung

Wertschöpfung erhöhen

Effizienz erhöhen

Verschwendung eliminieren

Kollaborativ & visuell

Warum Lean Construction Management?

Durch die Lean Arbeitsweise lassen sich Projekte durch die frühzeitige Einbeziehung aller relevanten Gewerke, Planer und Entscheidungsträger termingerecht, stressfrei und kosteneffizient realisieren.

Die kollaborative und wertschätzende Zusammenarbeit aller Gewerke verschlankt die Planung und verbessert den Informationsfluss zwischen Schnittstellen.

Optimales Ergebnis

Offene Kommunikation

Reibungslose Abläufe

Weniger Mängel

Kürzere Bauzeit

Lean Construction Management bei Lindner



2010

Erstes Lean Construction Management Projekt

Ausbau eines AIDA Kreuzfahrtschiffes



2011

Start der Implementierung

Lean Management in unserer Produktion in Arnstorf



2012

Ausweitung

Regelkommunikation und Shopfloor-Management



2014

Erste Anwendung in Bauvorhaben

Abwicklung nach Lean Construction Methoden



2020

Ausweitung


Alle Großprojekte und ausgewählte Kleinprojekte

Projektphasen & Prozess

Planung



Abwicklung & Steuerung

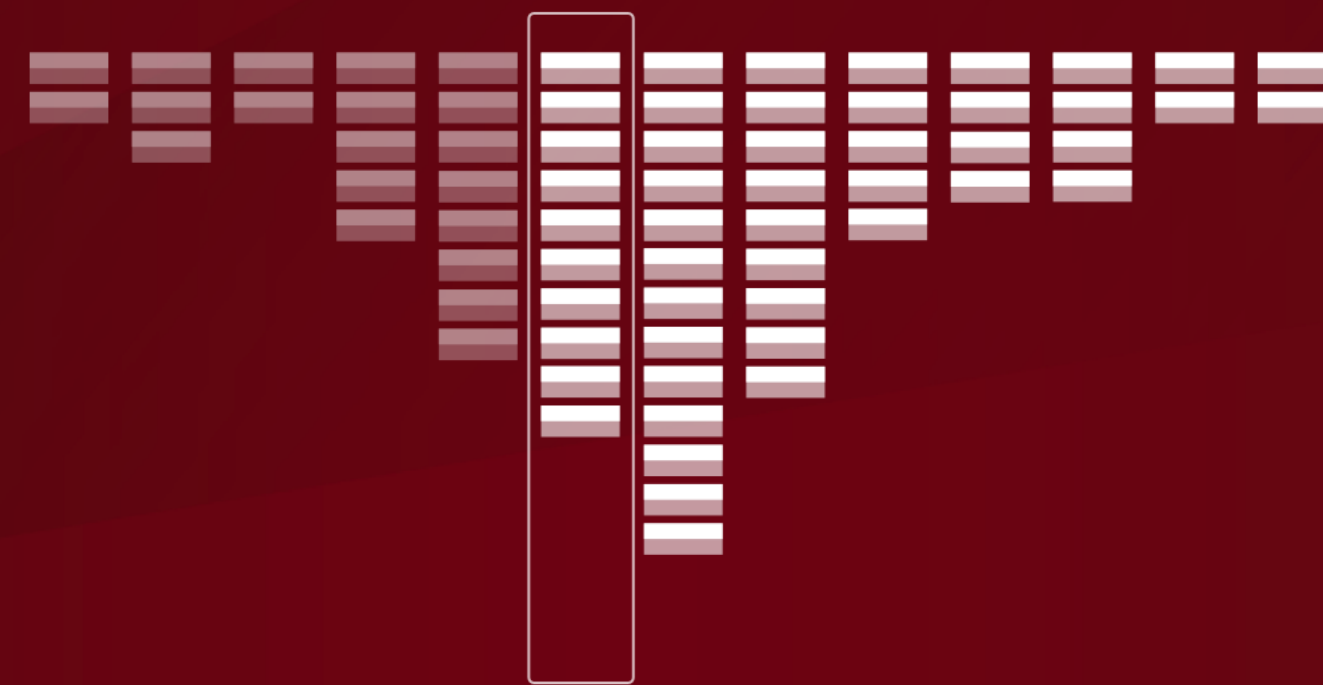

Abschluss



Planung



Planungssession

Zur Planungssession treffen sich alle projektrelevanten Gewerke und planen in partnerschaftlicher Atmosphäre den effektivsten Ablauf der einzelnen Arbeitsschritte.



Gewerke Neues Gewerk +

Meilensteine	M	◆
Planung Schreiner	PlaSc	■
Abbruch-/Rückbauarbeiten	Abbr	■
Metallbau- und Schlosserarbeiten	Schlo	■
Trockenbau	TB	■
Schreinerarbeiten	Schre	■
Estrich	Est	■
Systemboden	SyBo	■
Malerarbeiten	Mal	■
Fliesenarbeiten	Flie	■
Bodenbelagsarbeiten	Bod	■
Elektro	ELT	■
HLS	HLS	■
Planung Türen	PlaTü	■
Planung Lamellendecke	PlaLa	■
Planung Übergangsbereich	PlaÜ	■

Planung Schreiner 🗑️ ✎️ ■

Neue Tätigkeit +

- Tätigkeit
- Werk- und Montageplanung
- Prüfung und Freigabe
- Produktions- und Lieferprozess
- Materialdispo und Arbeitsvorbereitung
- Vergabeprozess
- Bemusterung Holzoberflächen, Wand + Boden



Gewerke & Tätigkeiten

Bauabschnittsplanung

Identifikation von wiederholbaren
und nicht wiederholbaren Bereichen






Bauabschnittsplanung
00





Bauabschnittsplanung
01

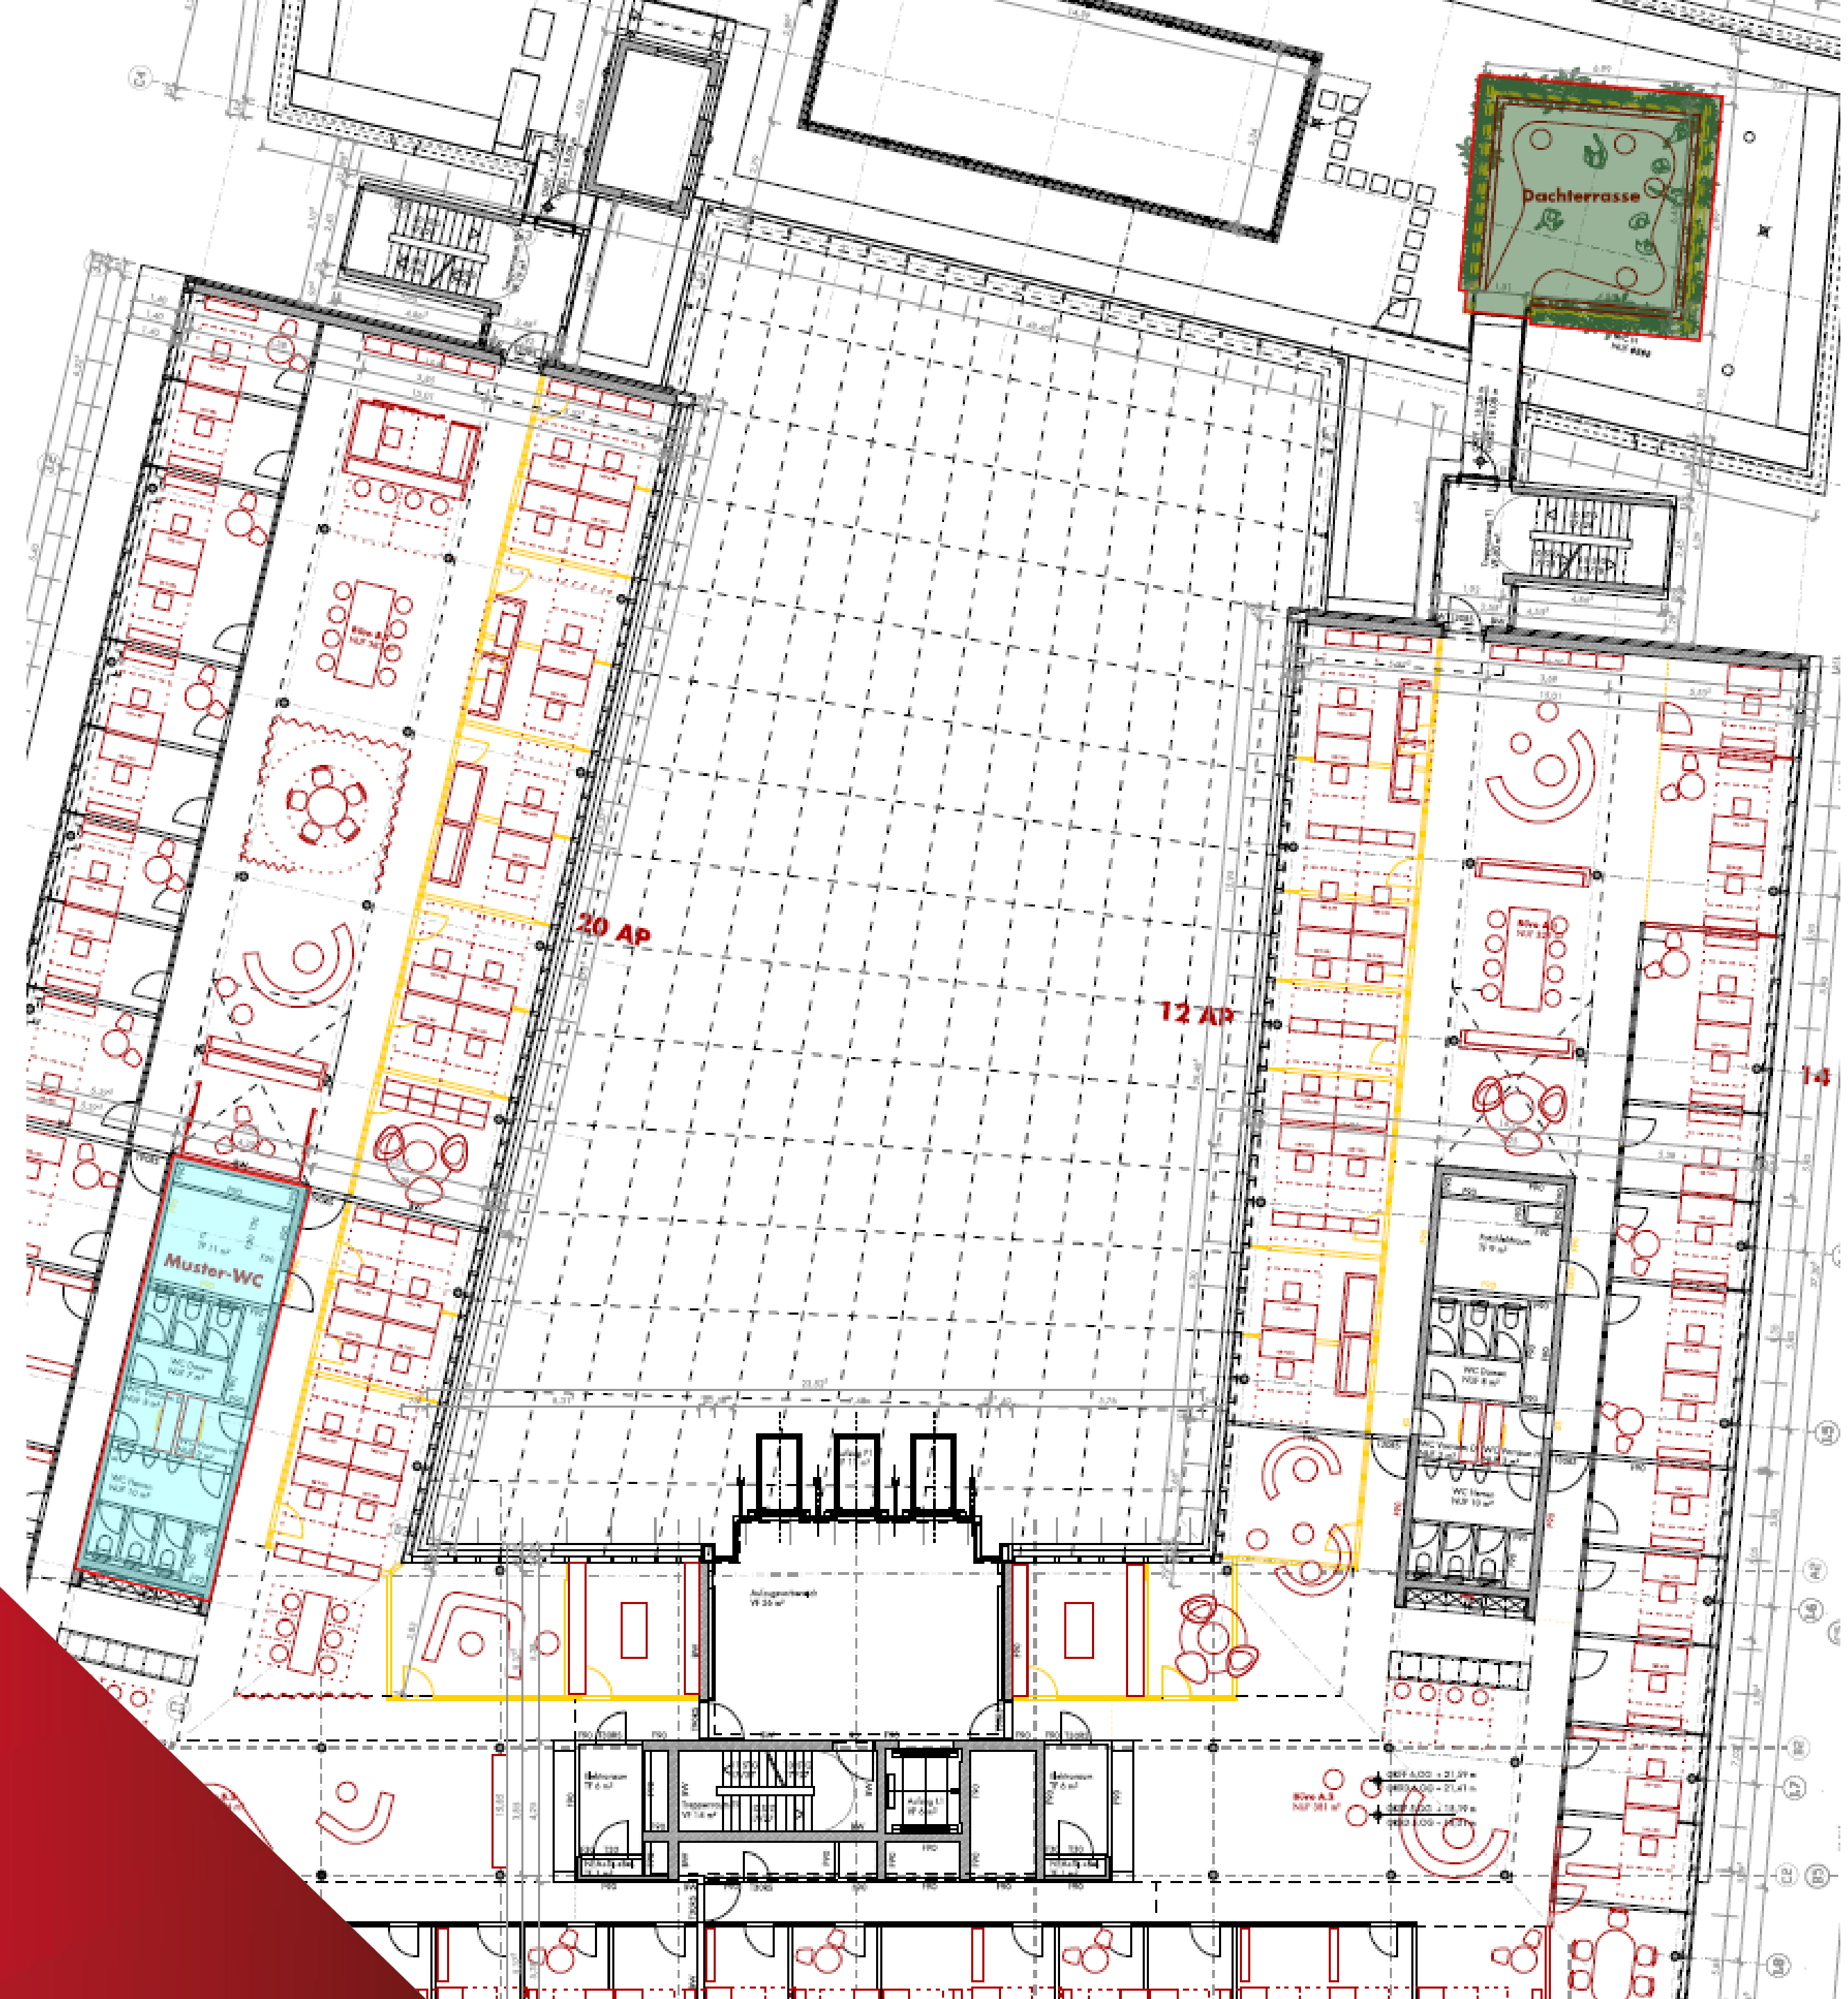

Bauabschnittsplanung
05-06



Bauabschnittsplanung
UG



- ADMINISTRATION
- Kopfdaten
- Projektbeteiligte
- PLANUNG
- Bauabschnitte**
- Gewerke
- Unterbrechungen
- Meilensteine
- DOKUMENTATION
- Änderungshistorie

Gebäude

	STOCKWERKE
Planung und Vergabe	0
Gebäude 4.1	8
Gebäude 4.2	2
Tiefgarage	2

Stockwerke Gebäude 4.1

	ABSCHNITTE
Empfang	0
Atrium	0
Plateau	0
Café	0
Open Space	0
Kantine	0
Dachterasse	0
Büro Sanitär	0

Abschnitte Empfang

Büroausbau

Legende

Woche 1 Woche 2 Woche 3 Woche 4 Woche 5 Woche 6 Woche 7

Systemtrennwand	Wandbau	Montage Flurpartien	Sprinkler installieren	Boden verlegen	Teppich verlegen	Interiorkonzeption
		3 Personen 2 Tage	2 Personen 3 Tage	2 Personen 4 Tage	4 Personen 2 Tage	4 Personen 4 Tage
Boden	Wandbau	Montage Zwischenwände	Sprinkler installieren	Teppich verlegen	Türen Montage	ELK Interiorkonzeption
		4 Personen 5 Tage	2 Personen 2 Tage	3 Personen 4 Tage	4 Personen 3 Tage	2 Personen 4 Tage
Heizung, Kühlung, Lüftung und Sanitär	Wandbau	Anbindung Lüftung Tür zu Büro	Transport Lagerung Türen	Fensterputz	ELK Interiorkonzeption	ELK Interiorkonzeption
		2 Personen 3 Tage	6 Personen 1 Tag	2 Personen 4 Tage	2 Personen 3 Tage	2 Personen 4 Tage
Elektro	Wandbau	Montage Schieberegler	Technikboden	Fensterputz	ELK Interiorkonzeption	ELK Interiorkonzeption
		2 Personen 2 Tage	2 Personen 2 Tage	2 Personen 4 Tage	2 Personen 3 Tage	2 Personen 4 Tage
Trockenbau	Wandbau	Montage Schieberegler	Technikboden	Fensterputz	ELK Interiorkonzeption	ELK Interiorkonzeption
		2 Personen 2 Tage	2 Personen 2 Tage	2 Personen 4 Tage	2 Personen 3 Tage	2 Personen 4 Tage





Suchen

Detailplanung

Kartenansicht


Alle ausklappen

Alle einklappen

Cafe



Gewerkezugplanung




Suchen

Detailplanung Kartenansicht

Alle ausklappen Alle einklappen

Büro/Sanitär









Gewerkezugplanung


Projektplanung

Kollaborative Erstellung eines Terminplans unter Berücksichtigung aller Meilensteine.



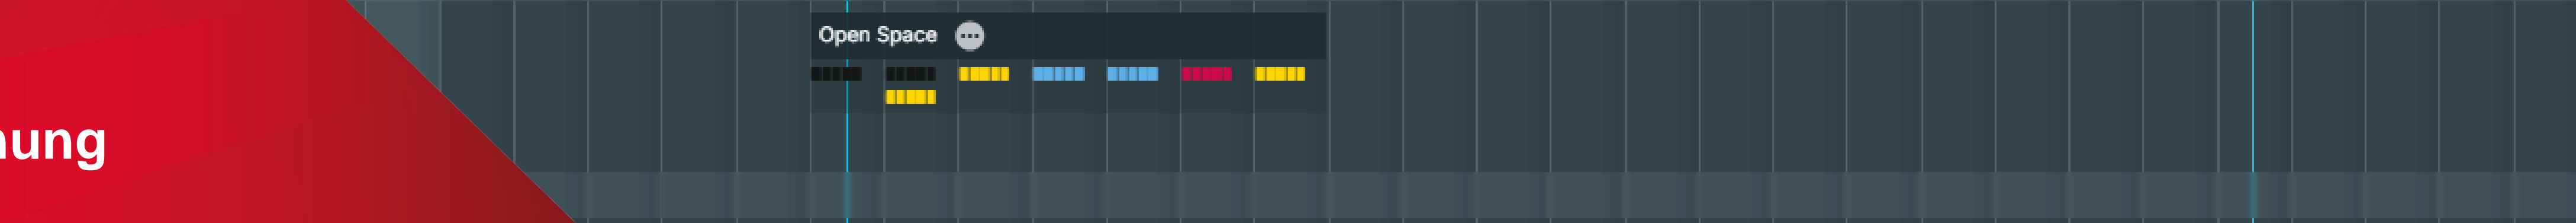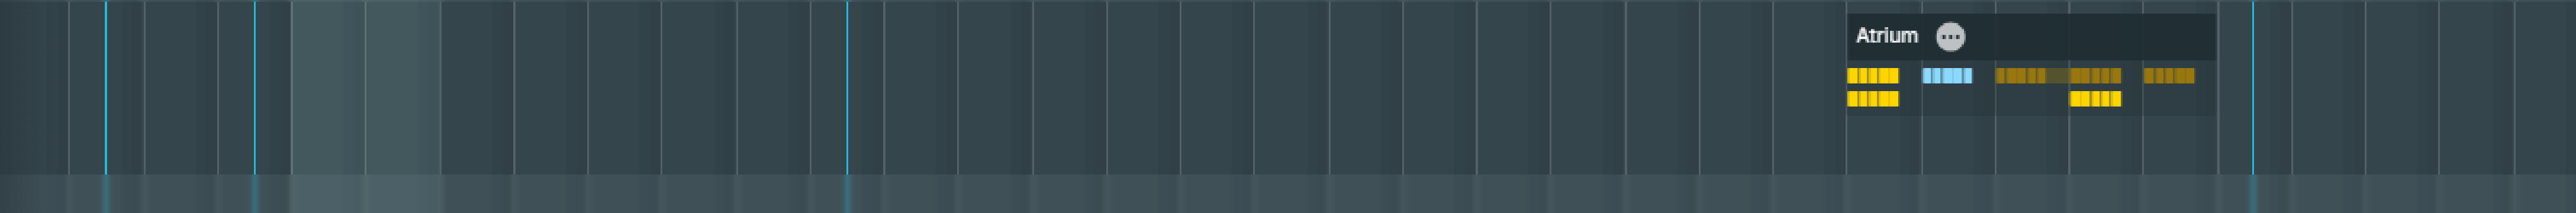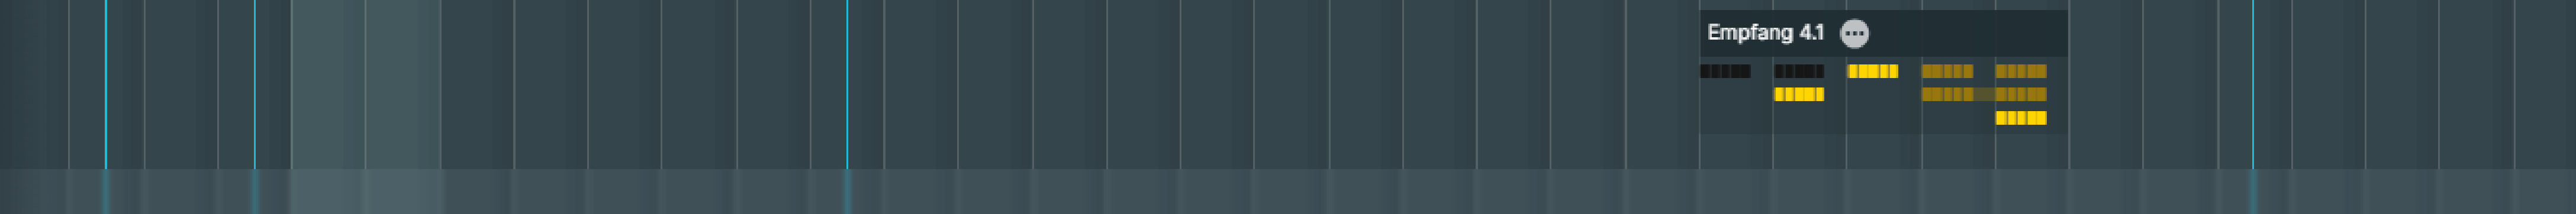

Projektplanung

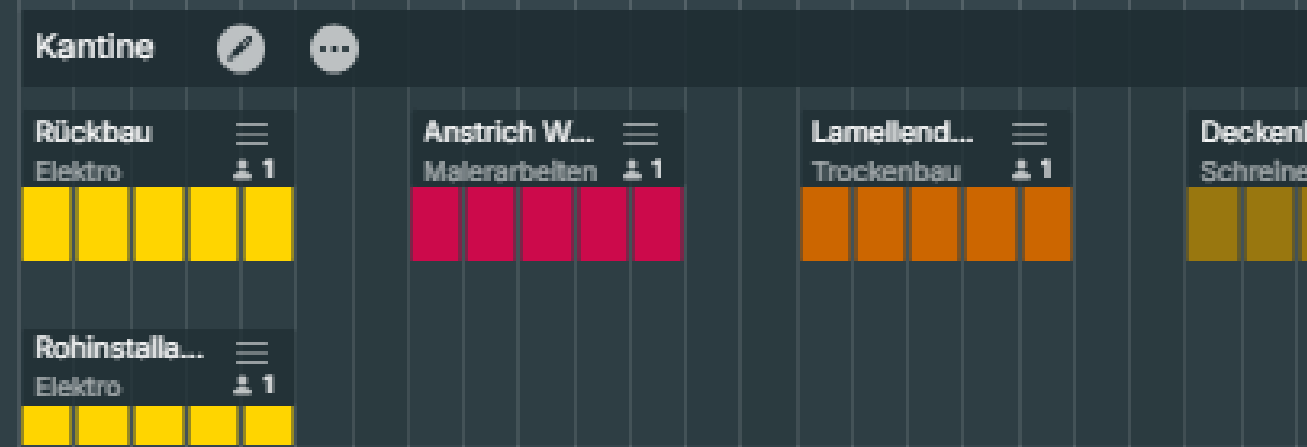

Projektplanung

Projektsname
Köbisdreieck, ehem. KPMG


Projektnummer
NW24/410738

Erstellt am
06. November 2024 um 10:15 (GMT-0h)

Ersteller
Karl Irbis

Gewerke

- Planung Schreiner PlaGc ■
- Abbruch/Rückbauarbeiten Abr ■
- Metallob- und Schlosserarbeiten Schlo ■
- Trockenbau TB ■
- Schreinerarbeiten Schre ■
- Estrich Est ■
- Systemböden SyBo ■
- Malerarbeiten Mal ■
- Floßenarbeiten Fla ■
- Bodenbelagsarbeiten Bod ■
- Elektro ELT ■
- HLS HLS ■
- Planung Türen PlaTu ■
- Planung Lamellendecke PlaLa ■
- Planung Übergreifend PlaÜ ■
- Planung Schlösser PlaS ■
- Robbau Rob ■
- Planung Fliesen PlaFl ■
- Planung Bodenbelag PlaBo ■
- Planung Maler PlaMa ■

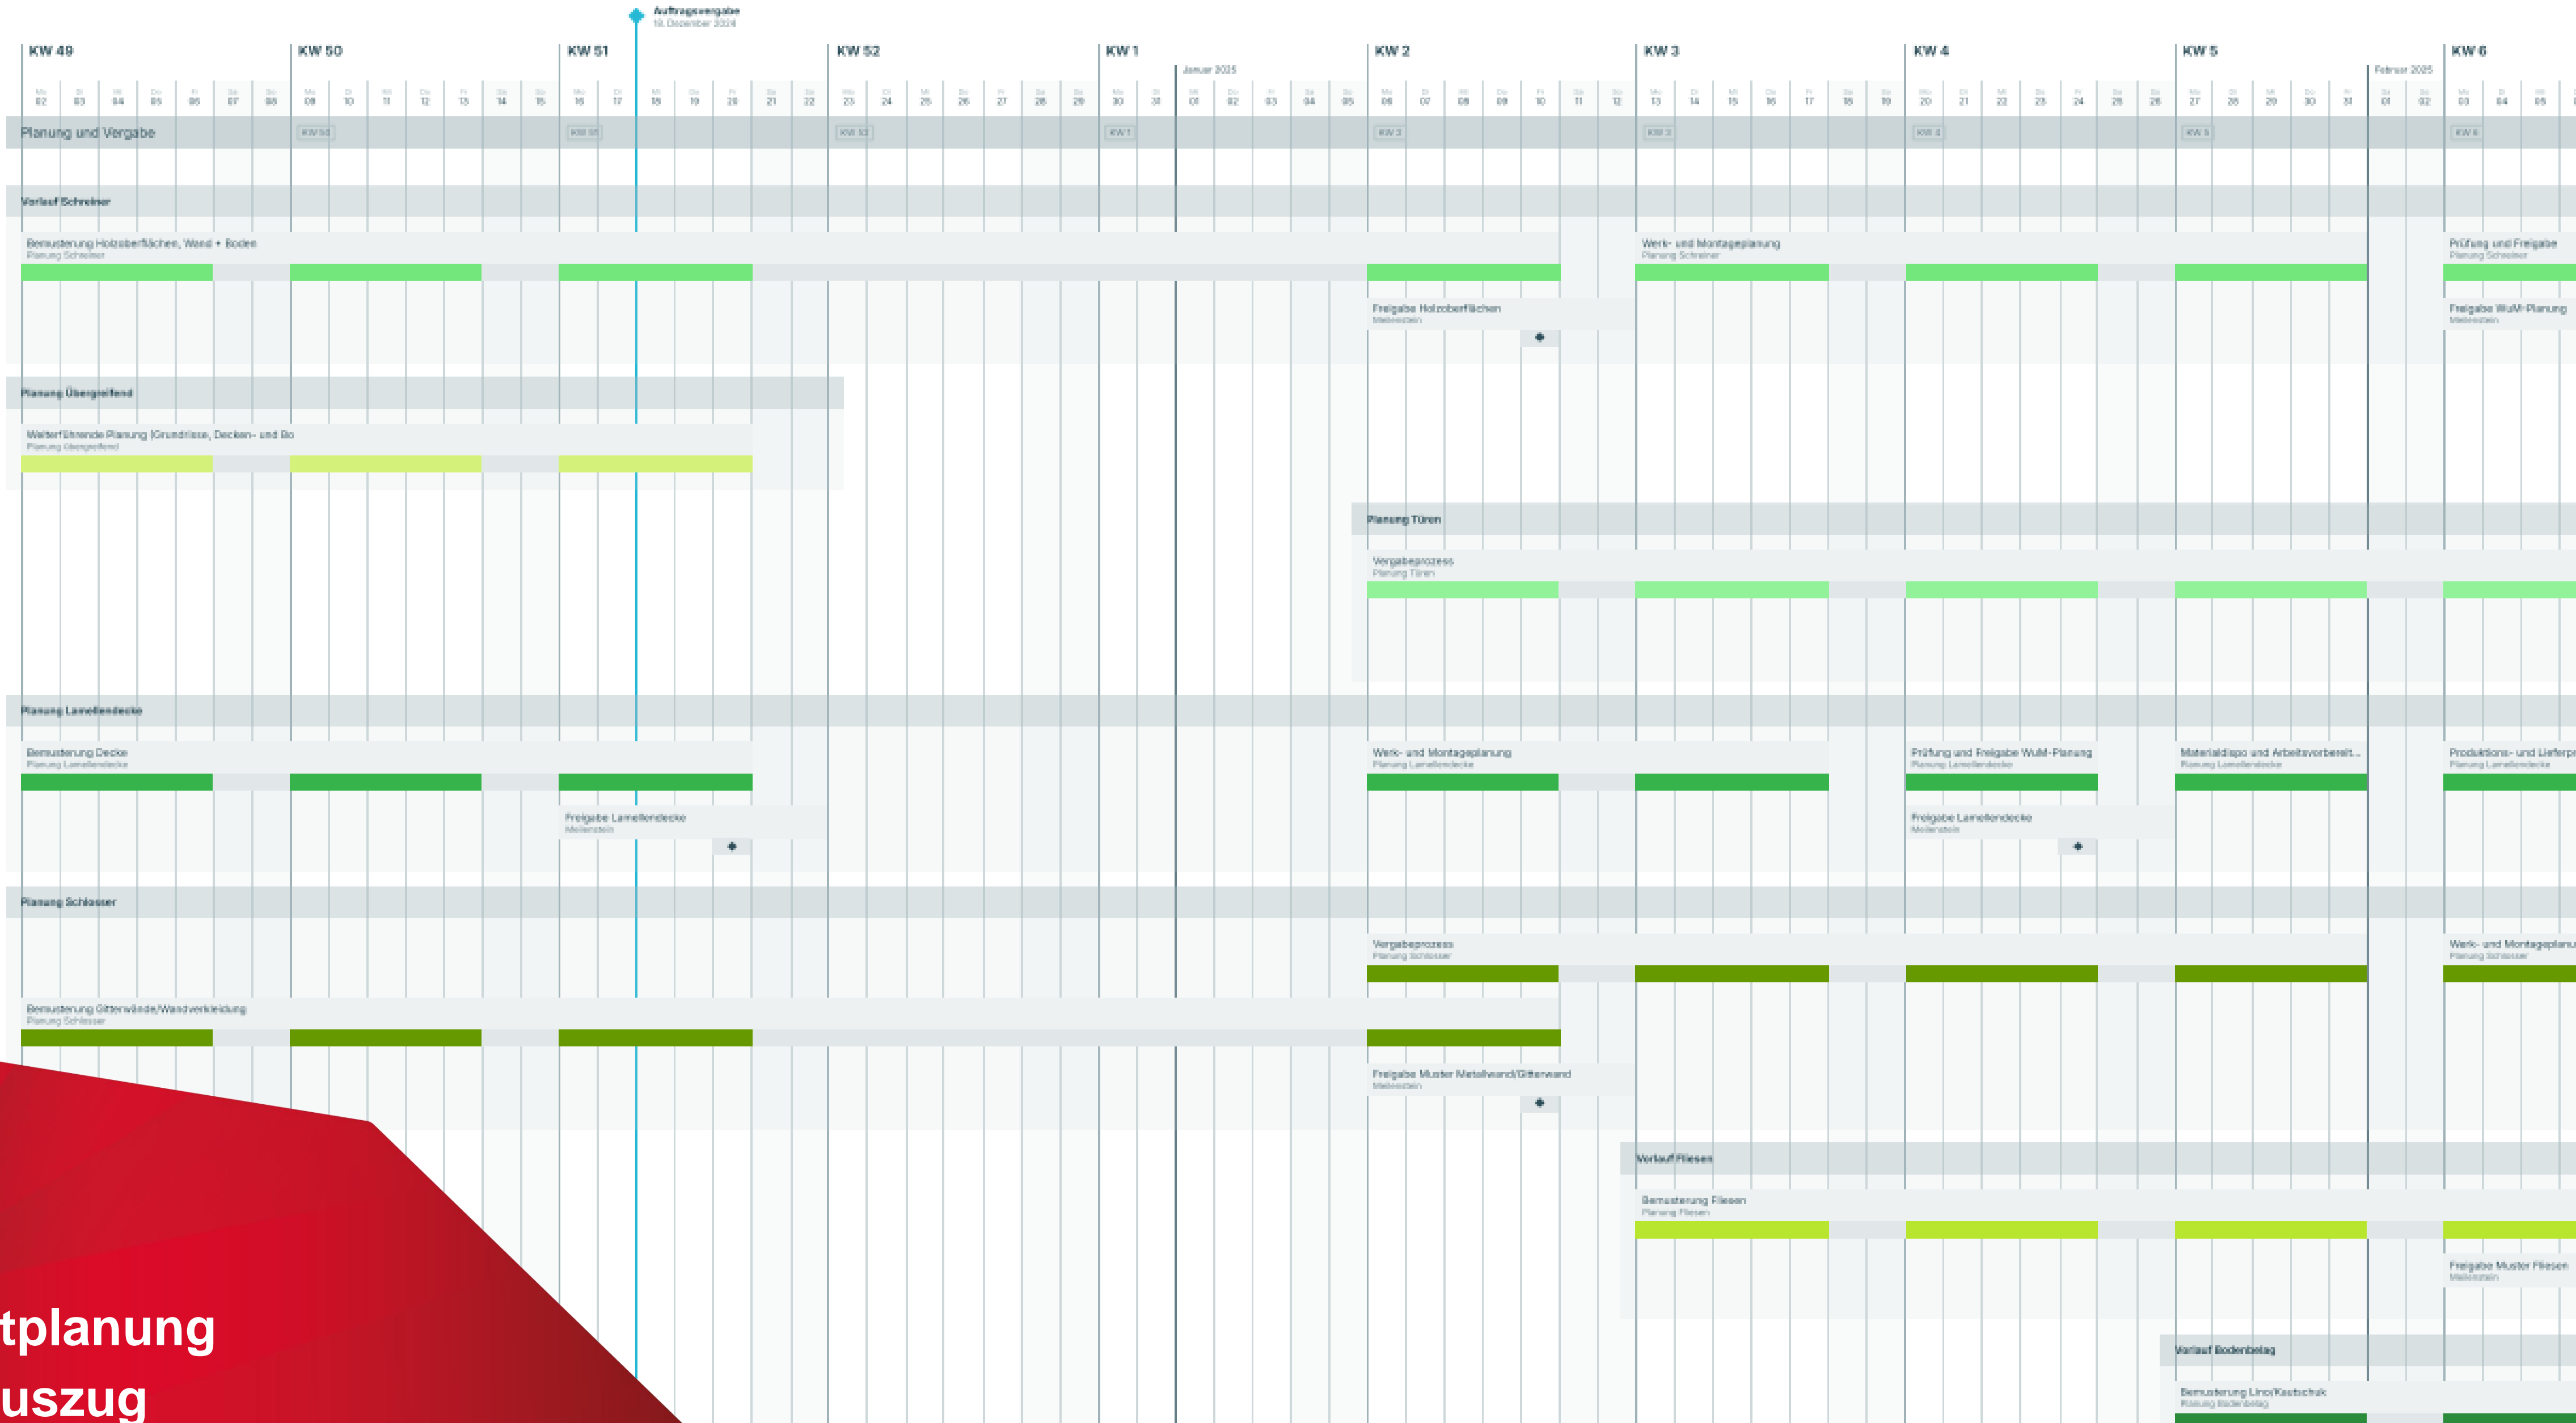

**Projektplanung
PDF-Auszug**

Gewerke & Tätigkeiten

Elektro




Trockenbau



HLS



Boden




Tischler



etc...

Gewerkezüge

Büroausbau



WC-Kerne



Schadstoffsanierung



Wohnungsausbau



Projektplanung

Haus A, 1.OG



Haus A, 2. OG



Haus A, 3. OG





Haus A, 4. OG



Projektplanung

Projektplanung



Haus A, 1.OG



Haus A, 2. OG




Haus A, 3. OG



Projektplanung

Abwicklung & Steuerung

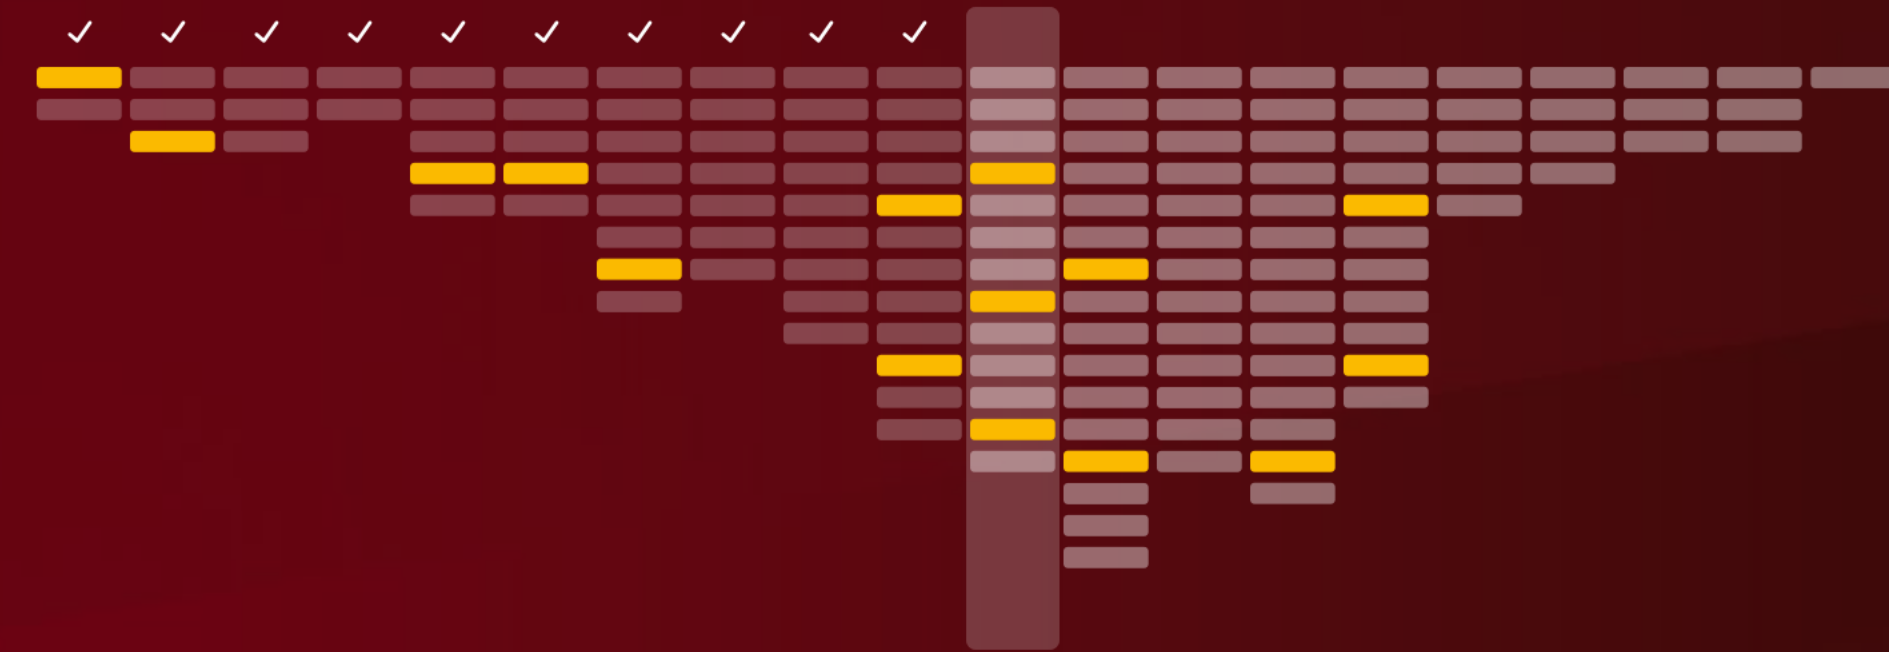

Gemeinsames Verständnis schaffen

Workshop mit Hotelsimulation



Abwicklung & Steuerung



Regelmässige Projektkommunikation

Kurze Meetings sorgen für
Transparenz und sichern eine
effiziente Arbeitsweise der Gewerke





Regelmässige
Projektkommunikation



Traube

KW 7 10. bis 16. Februar

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
9	9	9	9	9	0	0

KW 8 17. bis 23. Februar

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
9	9	9	9	9	0	0

KW 9 24. bis 02. März

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
9	9	9	9	9	0	0

KW 10 03. bis 09. März

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
13	13	13	13	13	0	0

KW 11 10. bis 16. März

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
8	8	8	8	8	0	0

KW 12 17. bis 23. März

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
10	10	10	10	10	10	10

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

- Materialdispo und Arbeitsvorbereitung Planung Schreiner ± 1

Planung Türen

- Erstellung Türliste Planung Türen ± 1
- Technische Klärung Planung Türen ± 1

Planung Lamellendecke

- Produktions- und Lieferprozess Planung Lamellendecke ± 1

Planung Schlosser

- Werk- und Montageplanung Planung Schlosser ± 1

Vorlauf Fliesen

- Vorlauf Fliesen Planung Fliesen ± 1

Vorlauf Bodenbelag

- Bemusterung Lino/Kautschuk Planung Bodenbelag ± 1

Vorlauf Maler

- Vorlauf Maler Planung Maler ± 1

Gebäude 4.1 > Open Space

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

- Produktions- und Lieferprozess Planung Schreiner ± 1

Planung Türen

- Erstellung Türliste Planung Türen ± 1
- Technische Klärung Planung Türen ± 1

Planung Lamellendecke

- Produktions- und Lieferprozess Planung Lamellendecke ± 1

Planung Schlosser

- Werk- und Montageplanung Planung Schlosser ± 1

Vorlauf Fliesen

- Vorlauf Fliesen Planung Fliesen ± 1

Vorlauf Bodenbelag

- Bemusterung Lino/Kautschuk Planung Bodenbelag ± 1
- Freigabe Muster Lino/Kautschuk Mellenstein

Gebäude 4.1 > Open Space

- Rückbau Boden/Wand/Decke Abbruch-/Rückbauarbeiten ± 1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

- Produktions- und Lieferprozess Planung Schreiner ± 1

Planung Türen

- Prüfung und Freigabe Planung Türen ± 1

Planung Lamellendecke

- Produktions- und Lieferprozess Planung Lamellendecke ± 1

Planung Schlosser

- Prüfung und Freigabe WuM-Planung Planung Schlosser ± 1
- Freigabe WuM-Planung Mellenstein

Vorlauf Fliesen

- Vorlauf Fliesen Planung Fliesen ± 1

Vorlauf Bodenbelag

- Vorlauf Bodenbelag Planung Bodenbelag ± 1

Gebäude 4.1 > Café

- Cafe
- Schutz Bestand Abbruch-/Rückbauarbeiten ± 1

Gebäude 4.1 > Open Space

- Open Space
- Rohinstallation Elektro ± 1

Tiefgarage > Fitnessstudio

- Fitnessstudio
- Schutz Bestand Abbruch-/Rückbauarbeiten ± 1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

- Produktions- und Lieferprozess Planung Schreiner ± 1

Planung Türen

- Prüfung und Freigabe Planung Türen ± 1
- Freigabe Türliste Mellenstein

Planung Lamellendecke

- Produktions- und Lieferprozess Planung Lamellendecke ± 1

Planung Schlosser

- Materialdispo und Arbeitsvorbereitung Planung Schlosser ± 1

Vorlauf Fliesen

- Vorlauf Fliesen Planung Fliesen ± 1

Vorlauf Bodenbelag

- Vorlauf Bodenbelag Planung Bodenbelag ± 1

Gebäude 4.1 > Café

- Cafe
- Rückbau Einbauten Abbruch-/Rückbauarbeiten ± 1
- Rückbau Boden/Wand/Decke Abbruch-/Rückbauarbeiten ± 1
- Rückbau Elektro ± 1

Gebäude 4.1 > Open Space

- Open Space
- Sichtestrich Estrich ± 1

Tiefgarage > Fitnessstudio

- Fitnessstudio
- Rückbau Einbauten Abbruch-/Rückbauarbeiten ± 1
- Rückbau Boden/Wand/Decke Abbruch-/Rückbauarbeiten ± 1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

- Produktions- und Lieferprozess Planung Schreiner ± 1

Planung Türen

- Materialdispo und Arbeitsvorbereitung Planung Türen ± 1

Planung Lamellendecke

- Produktions- und Lieferprozess Planung Lamellendecke ± 1

Planung Schlosser

- Produktions- und Lieferprozess Planung Schlosser ± 1

Vorlauf Fliesen

- Vorlauf Fliesen Planung Fliesen ± 1

Vorlauf Bodenbelag

- Vorlauf Bodenbelag Planung Bodenbelag ± 1

Gebäude 4.1 > Café

- Cafe
- UK Wände + einseitige Beplankung Trockenbau ± 1

Gebäude 4.1 > Open Space

- Open Space
- Trocknungszeit bis Begehbarkeit Estrich ± 0

Tiefgarage > Fitnessstudio

- Fitnessstudio
- UK Wände + einseitige Beplankung Trockenbau ± 1

Planung und Vergabe

Vorlauf Schreiner

- Produktions- und Lieferprozess Planung Schreiner

Planung Türen

- Produktions- und Lieferprozess Planung Türen

Planung Schlosser

- Produktions- und Lieferprozess Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

- Vorlauf Fliesen Planung Fliesen

Vorlauf Bodenbelag

- Vorlauf Bodenbelag Planung Bodenbelag

Gebäude 4.1 > Café


- Cafe
- Rohinstallation Sanitär HLS
- Anpassung Heiz-/Kälte-/Lüftungsterminals HLS

Gebäude 4.1 > Open Space

- Open Space
- Anstrich Wände + Decken Malerarbeiten

Tiefgarage > Fitnessstudio

- Fitnessstudio
- Roh- und Feininstallation HLS
- Rohinstallation Elektro



Traubenansicht

Projektname
Köbisdreieck, ehem. KPMG

Projektnummer
NW24/410738

Erstelldatum
06. November 2024 um 10:19 (GMT+0h)

Ersteller
Karl Inob

Gewerke

- Planung Schreiner PlaSc ■
- Abbruch-/Rückbauarbeiten Abbr ■
- Metallbau- und Schlossarbeiten Schlo ■
- Trockenbau TB ■
- Schreinerarbeiten Schre ■
- Estrich Est ■
- Systemboden SyBo ■
- Malerarbeiten Mal ■
- Fliesenarbeiten Flie ■
- Bodenbelagsarbeiten Bod ■
- Elektro ELT ■
- HLS HLS ■
- Planung Türen PlaTü ■
- Planung Lamellendecke PlaLa ■
- Planung Übergreifend PlaÜ ■
- Planung Schlosser PlaS ■
- Rohbau Roh ■
- PlaFl ■

2024

KW 49 02. bis 08. Dezember

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
4	4	4	4	4	1	1

- Planung und Verabe
Vorlauf Schreiner
- Bemusterung Holzoberflächen, Wan... ▲ 1
Planung Schreiner
 - Planung Übergreifend
 - Weiterführende Planung (Grundrisse... ▲ 1
Planung Übergreifend
 - Planung Lamellendecke
 - Bemusterung Decke ▲ 1
Planung Lamellendecke
 - Planung Schlosser
 - Bemusterung Gitterwände/Wandver... ▲ 1
Planung Schlosser

KW 50 09. bis 15. Dezember

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
4	4	4	4	4	1	1

- Planung und Verabe
Vorlauf Schreiner
- Bemusterung Holzoberflächen, Wan... ▲ 1
Planung Schreiner
 - Planung Übergreifend
 - Weiterführende Planung (Grundrisse... ▲ 1
Planung Übergreifend
 - Planung Lamellendecke
 - Bemusterung Decke ▲ 1
Planung Lamellendecke
 - Planung Schlosser
 - Bemusterung Gitterwände/Wandver... ▲ 1
Planung Schlosser

KW 51 16. bis 22. Dezember

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
4	4	4	4	4	0	0

- Planung und Verabe
Vorlauf Schreiner
- Bemusterung Holzoberflächen, Wan... ▲ 1
Planung Schreiner
 - Planung Übergreifend
 - Weiterführende Planung (Grundrisse... ▲ 1
Planung Übergreifend
 - Planung Lamellendecke
 - Bemusterung Decke ▲ 1
Planung Lamellendecke
 - Freigabe Lamellendecke ▲ 1
Melzerstein
 - Planung Schlosser
 - Bemusterung Gitterwände/Wandver... ▲ 1
Planung Schlosser

Auftragsvergabe

18. Dezember 2024

KW 52 23. bis 29. Dezember

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO

2024

KW 1 30. bis 05. Januar

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
6	6	6	6	6	1	1

KW 2 06. bis 12. Januar

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
6	6	6	6	6	1	1

- Planung und Verabe
Vorlauf Schreiner
- Bemusterung Holzoberflächen, Wan... ▲ 1
Planung Schreiner
 - Freigabe Holzoberflächen ▲ 1
Melzerstein
 - Planung Türen
 - Vergabeprozess ▲ 1
Planung Türen
 - Planung Lamellendecke
 - Werk- und Montageplanung ▲ 1
Planung Lamellendecke
 - Planung Schlosser
 - Werk- und Montageplanung ▲ 1
Planung Schlosser
 - Planung Schlosser
 - Vergabeprozess ▲ 1
Planung Schlosser
 - Vergabeprozess ▲ 1
Planung Schlosser
 - Bemusterung Gitterwände/Wandver... ▲ 1
Planung Schlosser
 - Freigabe Muster Metallwand/Gitterw... ▲ 1
Melzerstein
 - Vorlauf Maler
 - Erstellung Farbkonzept ▲ 1
Planung Maler

KW 3 13. bis 19. Januar

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
6	6	6	6	6	1	1

- Planung und Verabe
Vorlauf Schreiner
- Werk- und Montageplanung ▲ 1
Planung Schreiner
 - Planung Türen
 - Vergabeprozess ▲ 1
Planung Türen
 - Planung Lamellendecke
 - Werk- und Montageplanung ▲ 1
Planung Lamellendecke
 - Planung Schlosser
 - Vergabeprozess ▲ 1
Planung Schlosser
 - Vorlauf Fliesen
 - Bemusterung Fliesen ▲ 1
Planung Fliesen
 - Vorlauf Maler
 - Erstellung Farbkonzept ▲ 1
Planung Maler
 - Freigabe Farbkonzept ▲ 1
Melzerstein

KW 4 20. bis 26. Januar

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
6	6	6	6	6	1	1

- Planung und Verabe
Vorlauf Schreiner
- Werk- und Montageplanung ▲ 1
Planung Schreiner
 - Planung Türen
 - Vergabeprozess ▲ 1
Planung Türen
 - Planung Lamellendecke
 - Prüfung und Freigabe WUM-Plan... ▲ 1
Planung Lamellendecke
 - Freigabe Lamellendecke ▲ 1
Melzerstein
 - Planung Schlosser
 - Vergabeprozess ▲ 1
Planung Schlosser
 - Vorlauf Fliesen
 - Bemusterung Fliesen ▲ 1
Planung Fliesen
 - Vorlauf Maler
 - Erstellung Farbkonzept ▲ 1
Planung Maler
 - Freigabe Farbkonzept ▲ 1
Melzerstein



Traubenansicht
Ausdruck zum Aushang

Projektname
Köbisdreieck, ehem. KPMG

Projektnummer
NW24/410738

Erstelldatum
06. November 2024 um 11:08 (GMT-0h)

Ersteller
julia.zellner@lindner-group.com

Gewerke

- Planung Schreiner **PlaSc**
- Abbruch-/Rückbauarbeiten **Abbr**
- Metallbau- und Schlosserarbeiten **Schlo**
- Trockenbau **TB**
- Schreinerarbeiten **Schre**
- Estrich **Est**
- Systemboden **SyBo**
- Malerarbeiten **Mal**
- Fliesenarbeiten **Flie**
- Bodenbelagsarbeiten **Bod**
- Elektro **ELT**
- HLS **HLS**
- Planung Türen **PlaTü**
- Planung Lamellendecke **PlaLa**
- Planung übergreifend **PlaÜ**
- Planung Schlosser **PlaS**
- Rohbau **Roh**

2024

KW 49 02. bis 08. Dezember

KW 50 09. bis 15. Dezember

KW 51 16. bis 22. Dezember

Planung und Vergabe
Vorlauf Schreiner

Planung übergreifend

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Projektname
Köbisdreieck, ehem. KPMG

Projektnummer
NW24/410738

Erstelldatum
06. November 2024 um 11:08 (GMT-0h)

Ersteller
julia.zellner@lindner-group.com

Gewerke

- Planung Schreiner **PlaSc**
- Abbruch-/Rückbauarbeiten **Abbr**
- Metallbau- und Schlosserarbeiten **Schlo**
- Trockenbau **TB**
- Schreinerarbeiten **Schre**
- Estrich **Est**
- Systemboden **SyBo**
- Malerarbeiten **Mal**
- Fliesenarbeiten **Flie**
- Bodenbelagsarbeiten **Bod**

KW 2 06. bis 12. Januar

KW 3 13. bis 19. Januar

KW 4 20. bis 26. Januar

Planung und Vergabe
Vorlauf Schreiner

Planung Türen

Planung Lamellendecke

Planung Schlosser

Vorlauf Fliesen

Vorlauf Maler

Traubenansicht
Ausdruck zum Aushang -
Legende

Projektname
Köbisdreieck, ehem. KPMG

Projektnummer
NW24/410738

Erstelldatum
06. November 2024 um 11:08 (GMT-0h)

Ersteller
julia.zellner@lindner-group.com

Gewerke

- Planung Schreiner PlaSc
- Abbruch-/Rückbauarbeiten Abbr
- Metallbau- und Schlosserarbeiten Schlo
- Trockenbau TB
- Schreinerarbeiten Schre
- Estrich Est
- Systemboden SyBo
- Malerarbeiten Mal
- Fliesenarbeiten Flie
- Bodenbelagsarbeiten Bod
- Elektro ELT
- HLS HLS
- Planung Türen PlaTü
- Planung Lamellendecke PlaLa
- Planung übergreifend PlaÜ
- Planung Schlosser PlaS
- Rohbau Roh
- PlaFl

2024

KW 49 02. bis 08. Dezember

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
4	4	4	4	4	0	0

- Planung und Vergabe**
Vorlauf Schreiner
- Bemusterung Holzoberflächen, Wan...
Planung Schreiner 1
 - Planung übergreifend
 - Weiterführende Planung (Grundrisse...
Planung übergreifend 1
 - Planung Lamellendecke**
 - Bemusterung Decke
Planung Lamellendecke 1
 - Planung Schlosser**
 - Bemusterung Gitterwände/Wandver...
Planung Schlosser 1

KW 50 09. bis 15. Dezember

MO	DI	MI	DO
4	4	4	4

- Planung und Vergabe**
Vorlauf Schreiner
- Bemusterung Holz...
Planung Schreiner
 - Planung übergreifend
 - Weiterführende Pla...
Planung übergreifend
 - Planung Lamellendecke**
 - Bemusterung Decke
Planung Lamellendecke
 - Planung Schlosser**
 - Bemusterung Gitter...
Planung Schlosser

KW 2 06. bis 12. Januar

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
6	6	6	6	6	0	0

Planung und Vergabe
Vorlauf Schreiner

- Bemusterung Holzoberflächen, Wan... 1
Planung Schreiner
- Freigabe Holzoberflächen
Meilenstein
- Planung Türen**
- Vergabeprozess 1
Planung Türen
- Planung Lamellendecke**
- Werk- und Montageplanung 1
Planung Lamellendecke
- Planung Schlosser**
- Vergabeprozess 1
Planung Schlosser
- Bemusterung Gitterwände/Wandver... 1
Planung Schlosser
- Freigabe Muster Metallwand/Gitterw...
Meilenstein
- Vorlauf Maler**
- Erstellung Farbkonzept 1
Planung Maler

KW 2 06. bis 12. Januar

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
6	6	6	6	6	0	0

- Planung und Vergabe**
Vorlauf Schreiner
- Bemusterung Holzoberflächen, Wan...
Planung Schreiner 1
 - Freigabe Holzoberflächen
Meilenstein
 - Planung Türen**
 - Vergabeprozess 1
Planung Türen
 - Planung Lamellendecke**
 - Werk- und Montageplanung 1
Planung Lamellendecke
 - Planung Schlosser**
 - Vergabeprozess 1
Planung Schlosser
 - Bemusterung Gitterwände/Wandver...
Planung Schlosser 1
 - Freigabe Muster Metallwand/Gitterw...
Meilenstein
 - Vorlauf Maler**
 - Erstellung Farbkonzept 1
Planung Maler

KW 3 13. bis 19. Januar

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
6	6	6	6	6	0	0

- Planung und Vergabe**
Vorlauf Schreiner
- Werk- und Montageplanung 1
Planung Schreiner
 - Planung Türen**
 - Vergabeprozess 1
Planung Türen
 - Planung Lamellendecke**
 - Werk- und Montageplanung 1
Planung Lamellendecke
 - Planung Schlosser**
 - Vergabeprozess 1
Planung Schlosser
 - Vorlauf Fliesen**
 - Bemusterung Fliesen 1
Planung Fliesen
 - Vorlauf Maler**
 - Erstellung Farbkonzept 1
Planung Maler
 - Freigabe Farbkonzept
Meilenstein

KW 4 20. bis 26. Januar

MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
6	6	6	6	6	0	0

- Planung und Vergabe**
Vorlauf Schreiner
- Werk- und Montageplanung 1
Planung Schreiner
 - Planung Türen**
 - Vergabeprozess 1
Planung Türen
 - Planung Lamellendecke**
 - Prüfung und Freigabe WUM-Planung 1
Planung Lamellendecke
 - Freigabe Lamellendecke
Meilenstein
 - Planung Schlosser**
 - Vergabeprozess 1
Planung Schlosser
 - Vorlauf Fliesen**
 - Bemusterung Fliesen 1
Planung Fliesen
 - Vorlauf Maler**
 - Freigabe Farbkonzept 1
Planung Maler


Traubenansicht

Ausdruck zum Aushang
- Wochenspalten

Abschluss




Mängel



Bauzeit



Änderungen

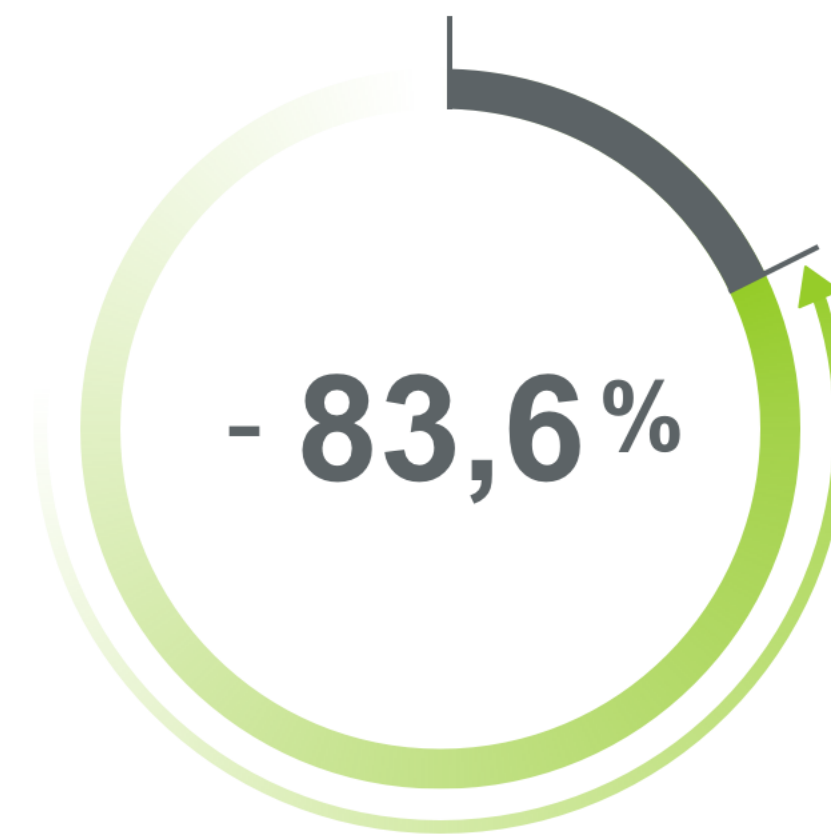

Behinderungen



Abschluß



Lindner
